CALI
SOMOS TODOS

Secretaría de Vivienda Social y Hábitat


Empresa de Desarrollo y Renovación Urbana

Secretaría de Gestión del Riesgo, Emergencias y Desastres

Cronogramas y actividades para demoliciones en las manzanas 203,167 y 169
Actividades en el marco del Plan Cristo Rey

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MANZANA 203

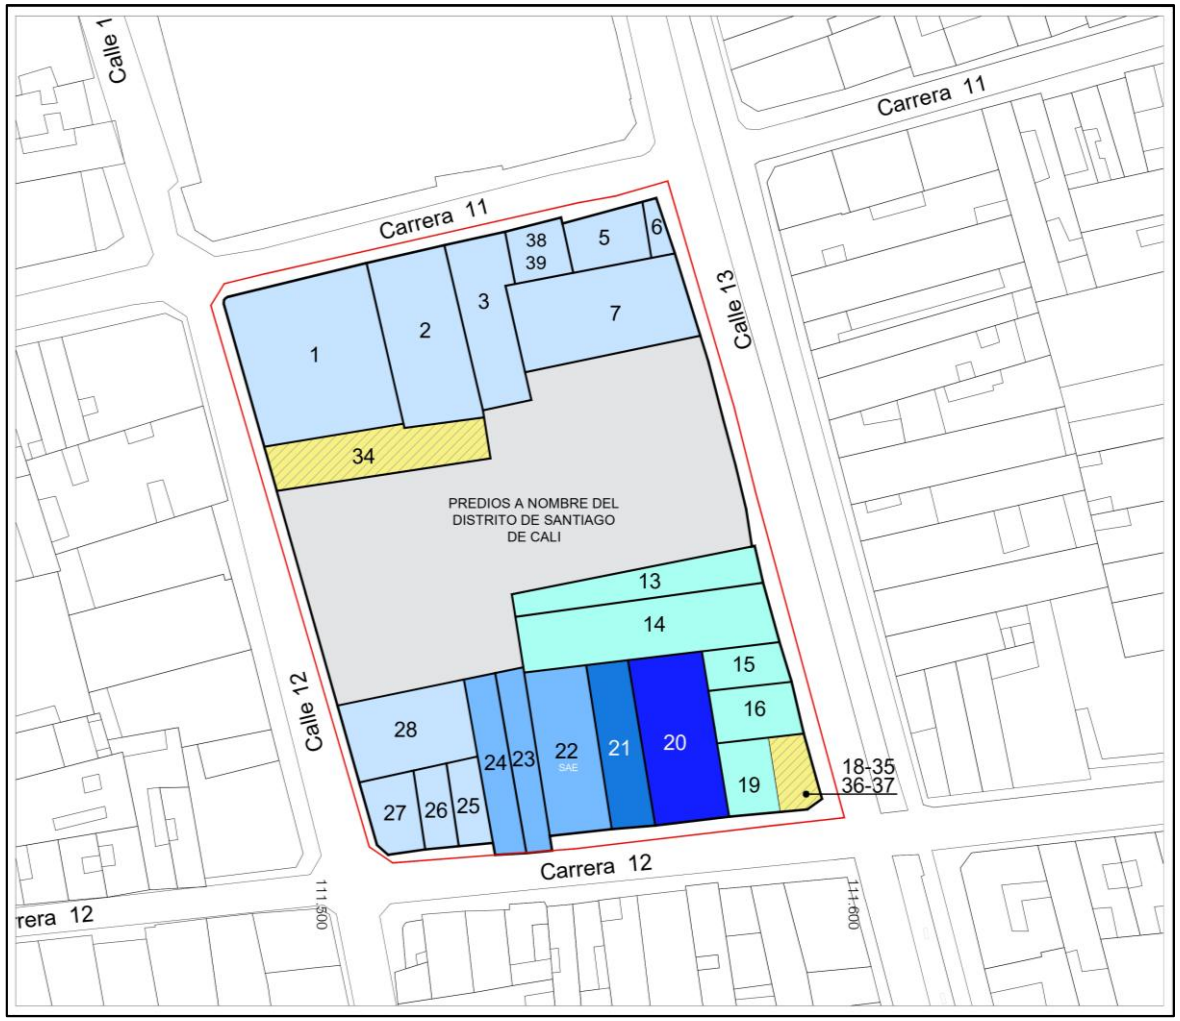


FECHA DEMOLICIÓN	PREDIOS
Octubre 2	**20**
Octubre 9	**21**
Octubre 19	**22,23,24**
Octubre 26-30	**1,2,3,38,39,5,6,7 ,25,26,27,28**
Diciembre 4	**13,14,15,16,19**
Enero 2027	**34,18**

CALI SOMOS TODOS

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ESTADO A 1 NOVIEMBRE 2026 (MZ 203)

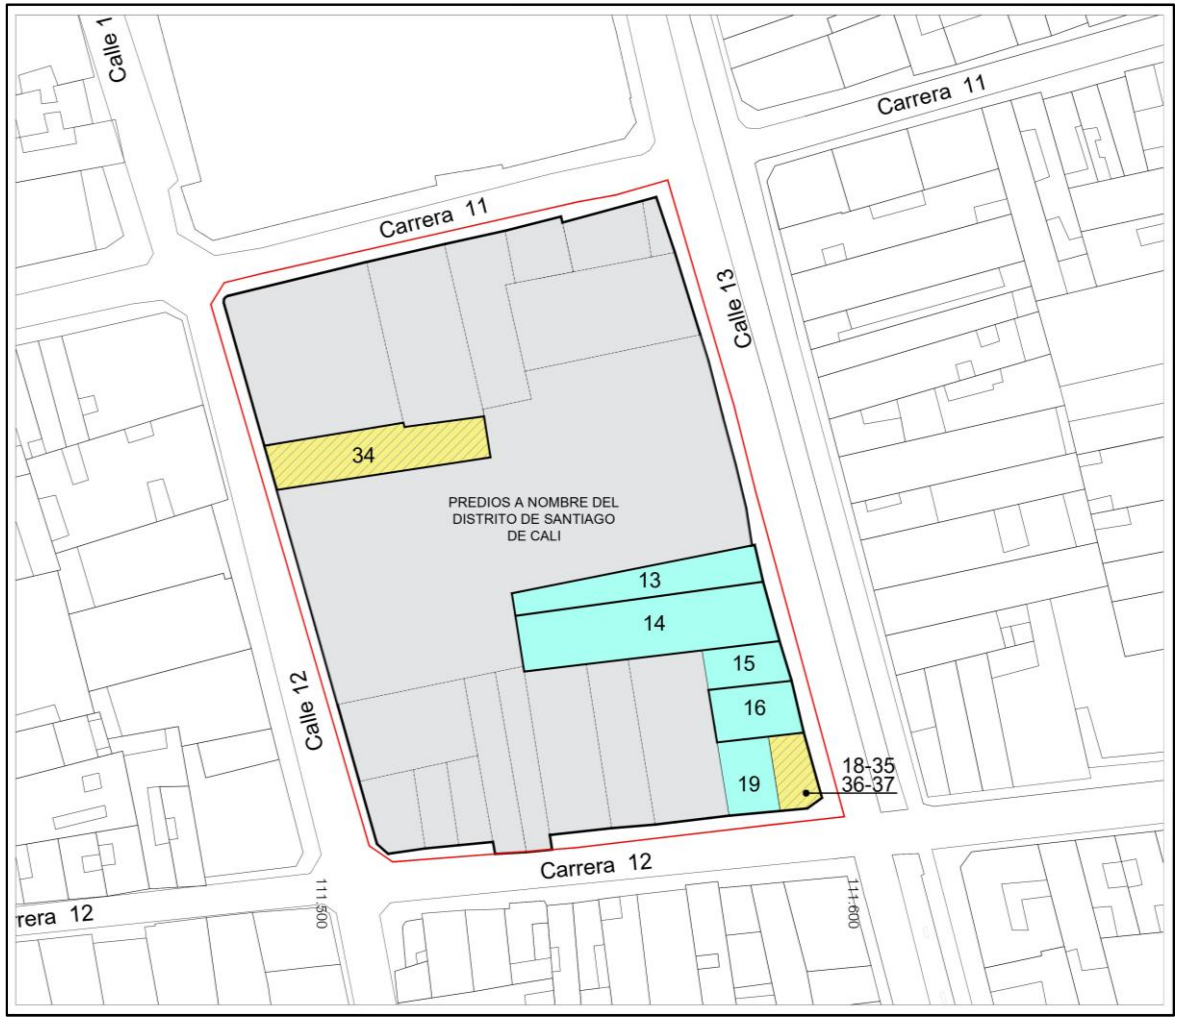


FECHA DEMOLICIÓN	PREDIOS
DEMOLIDOS	
Diciembre 4	**13,14,15,16,19**
Enero 2027	**34,18**

CALI SOMOS TODOS

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

ESTADO A 30 DICIEMBRE 2026 (MZ 203)

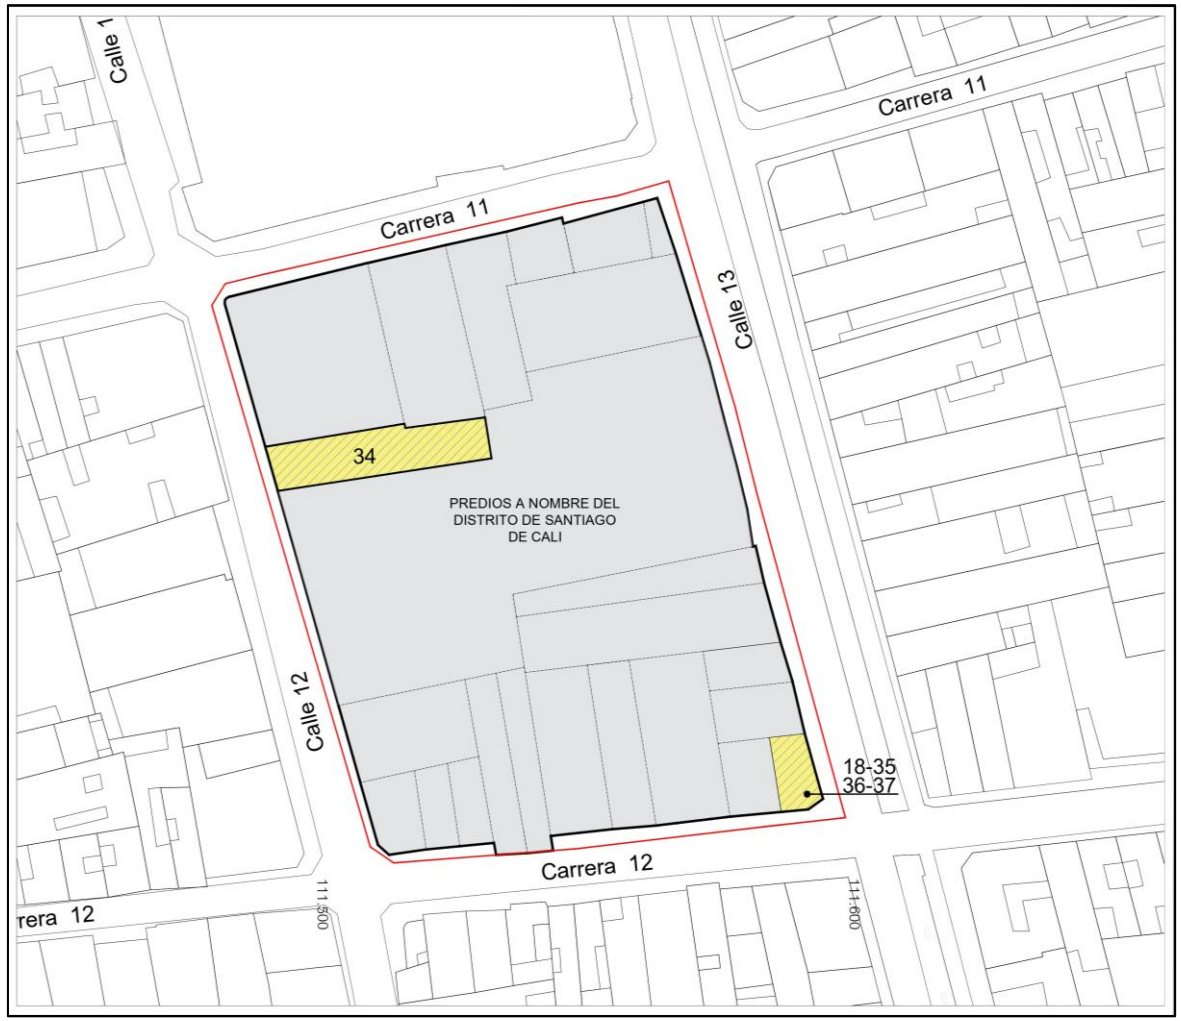


FECHA DEMOLICIÓN	PREDIOS
DEMOLIDOS	
ENERO 2027	34,18

CALI SOMOS TODOS

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI

PLAN CRISTO REY - MANZANA 167

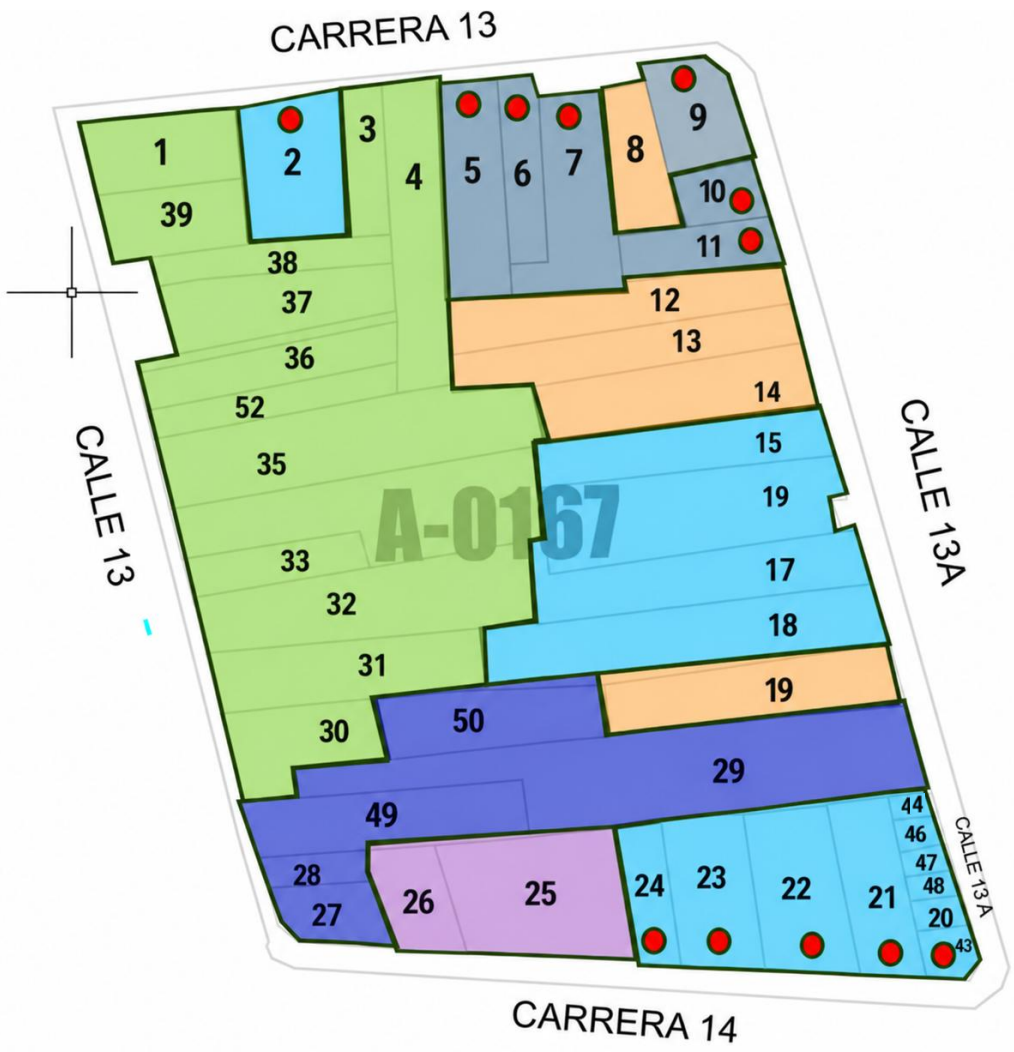


CRONOGRAMA ACTIVIDADES

	FECHA	PREDIOS	NECESIDADES
	Demolidos	1,3,4,30,31,32,33,34,35, 36, 37, 38,39, 51, 52	• 15 Predios ya demolidos. ✅ • Pendiente cerramiento – SVSH (30 de diciembre de 2026)
	15 DE OCTUBRE	5,6,7,10,11, 9 (Inhabitable – SGRED)	• Comité de Riesgos para aprobación inicio demoliciones (05/10/2026) ✅ • Subsidios de arrendamiento para hogares- SVSH (05 - 09/10/2026) • Apoyo Económico para negocios - Sec. Desarrollo Económico (05 -09/10/2026)

🔴 Sticker rojo de SGRED

PLAN CRISTO REY - MANZANA 167

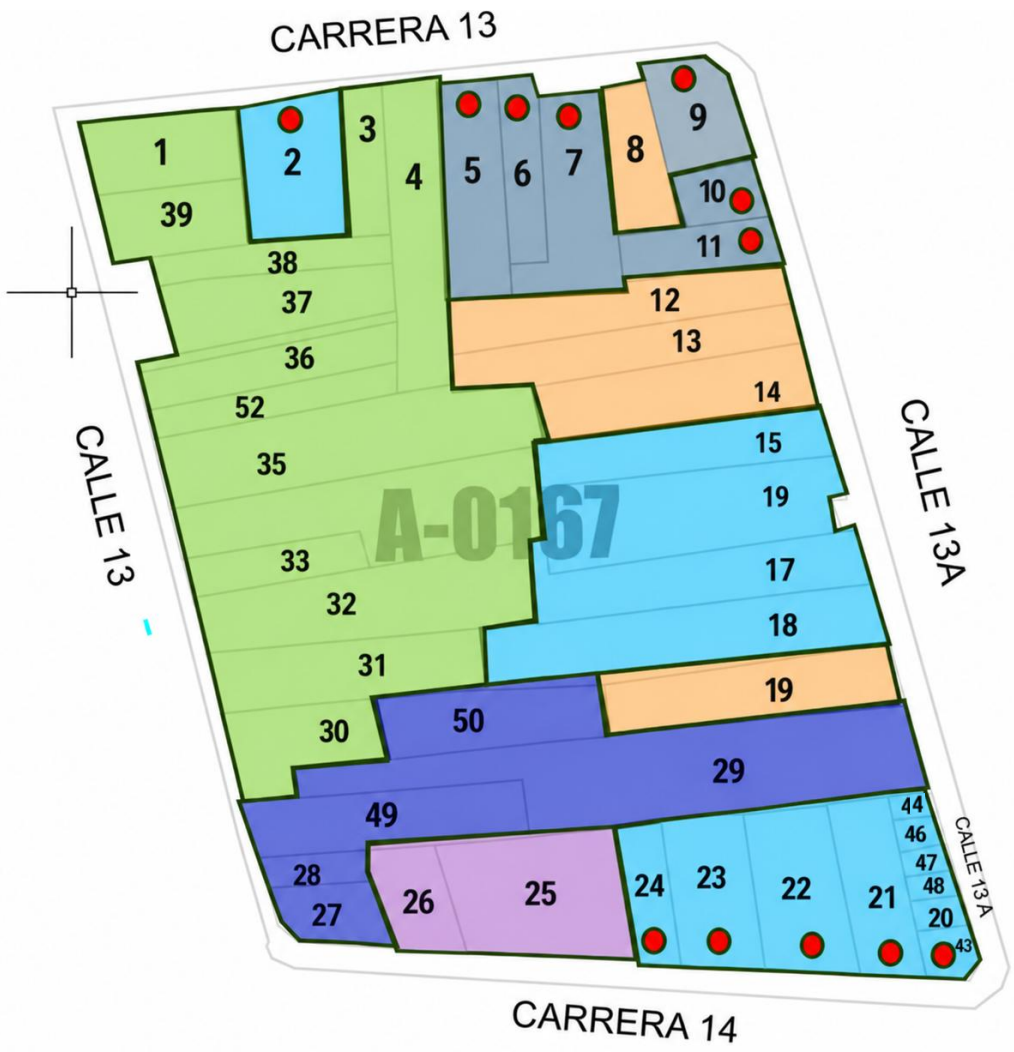


CRONOGRAMA ACTIVIDADES

	FECHA	PREDIOS	NECESIDADES
	30 DE OCTUBRE	15,16,17,18	• Demolición – Fideicomiso (15/10/2026) • Gestión retiro de vehículos de la policía - SSJ (05-09/10/2026) **(Pendiente)**
		20,43,44,45,46,47,48 (PH) 2,21,22,23,24 (Inhabitable – SGRED)	• Comité de Riesgos para aprobación inicio demoliciones - SGRED (05-09/10/2026) • Subsidios de arrendamiento – SVSH (05-09/10/2026) • Apoyo Económico para negocios - Desarrollo Económico (05-09/10/2026)

Sticker rojo de SGRED

PLAN CRISTO REY - MANZANA 167

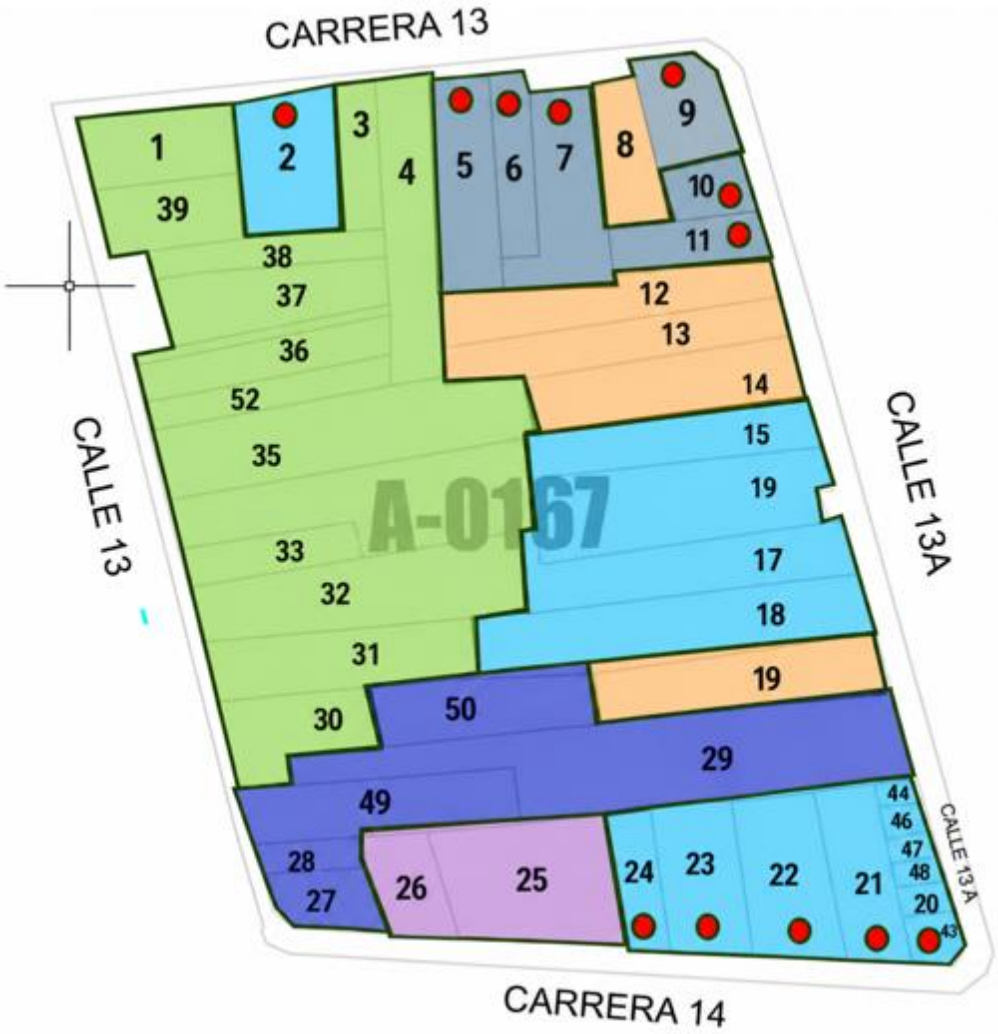


CRONOGRAMA ACTIVIDADES

	FECHA	PREDIOS	NECESIDADES
	05 DE DICIEMBRE	**Expropiación** 8,13	• Demoliciones – Fideicomiso (01-05/12/2026) • Notificación a Propietarios de Expropiación (Personal 5 días, aviso 10 días) – EDRU (05/10/2026) ✅ • Disponibilidad del Recurso en Banco – Fideicomiso (06/10/2026) ✅ • Radicación Resolución de Expropiación – EDRU (a partir del 15/10/2026) • Apoyo ante Oficina de Instrumentos Públicos para disminución de tiempo de Transferencia de Dominio - Alcalde

🔴 Sticker rojo de SGRED

PLAN CRISTO REY - MANZANA 167

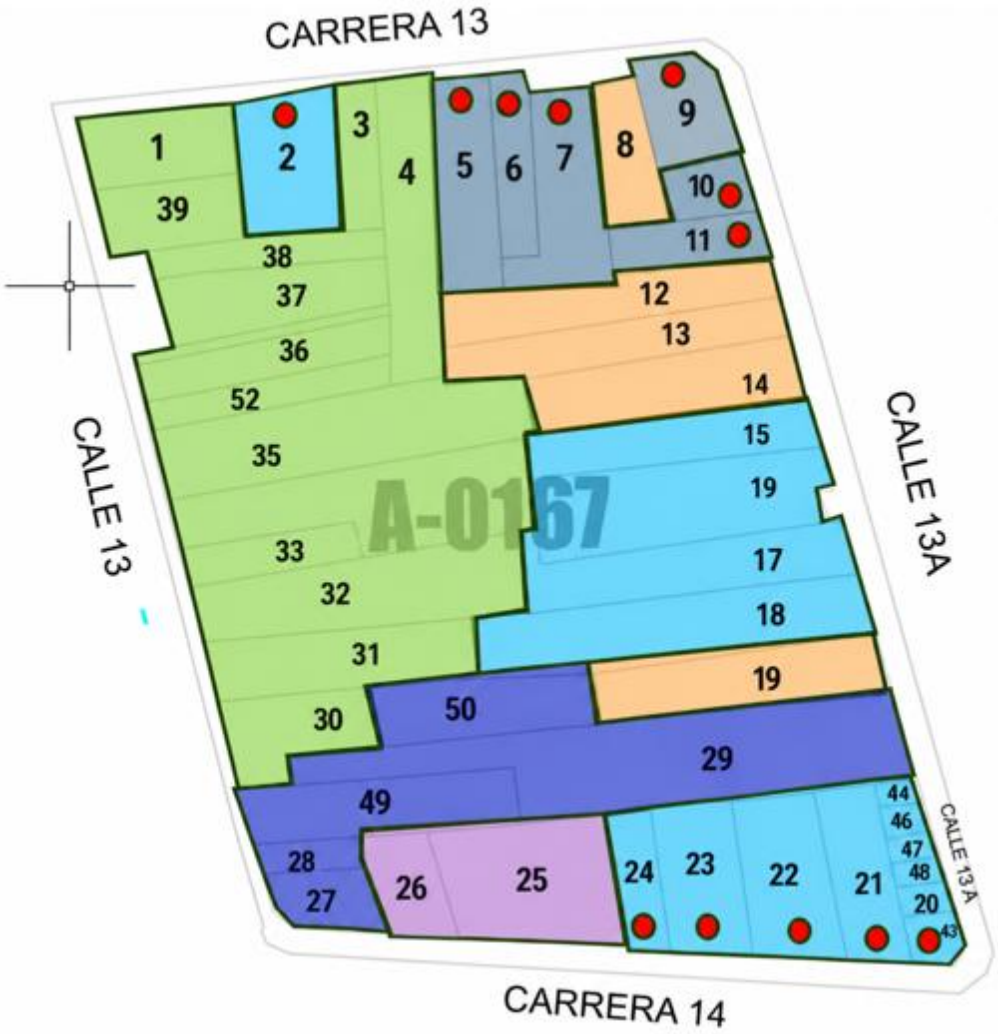


CRONOGRAMA ACTIVIDADES

	FECHA	PREDIOS	NECESIDADES
	05 DE DICIEMBRE	**Escritura Pública** 12, 14 19	• Demoliciones – Fideicomiso (01-04/12/2026) • Firma Minuta – EDRU, Fideicomiso, Propietarios (16/10/2026) • Registro de Escritura Pública ante Oficina de Instrumentos Públicos – Notaria (19/10/2026) • Apoyo ante Oficina de Instrumentos Públicos para disminución de tiempo de Transferencia de Dominio – Alcalde

Sticker rojo de SGRED

PLAN CRISTO REY - MANZANA 167

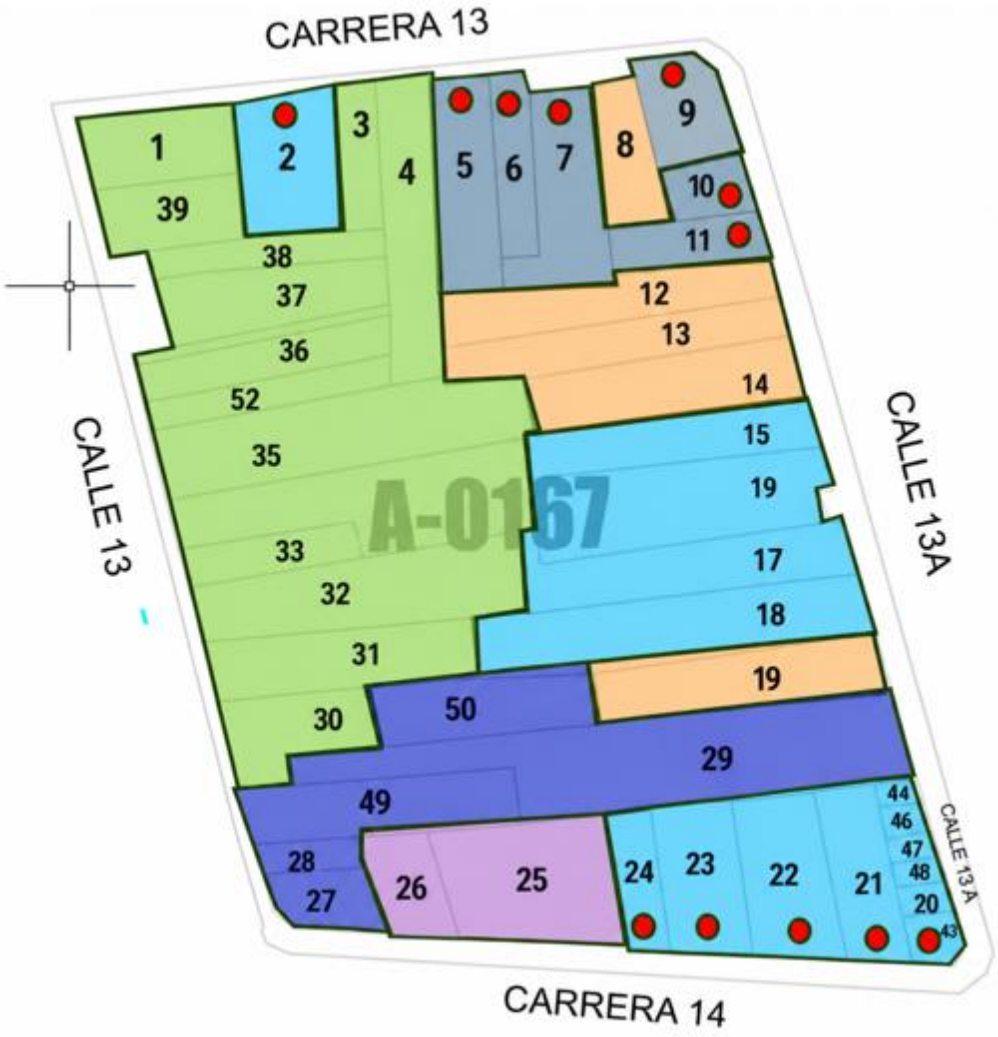


Sticker rojo de SGRED

CRONOGRAMA ACTIVIDADES

	FECHA	PREDIOS	NECESIDADES
	2027	27, 28, 29, 49, 50 Rosquillas Caleñas	Compra integral por parte del Fideicomiso (11 predios): • 5 predios de la MZ 167 ($5.000 millones) • 6 predios de la MZ 166 ($ 6.000 – 8.000 millones sujeto a lucro cesante)
	2027	26 y 25	• Recursos para compra por parte del Fideicomiso ($1.100 millones) – Etapa 3 SVHS • Supeditado al proceso de compra de los predios 19, 14, 13, 12, 9, 8, 6, 3, 2 (Etapa 2) – **Tiempo estimado 3 a 4 meses (términos de ley)** • Adquirido y Demolido (Abril – Mayo /2027)


PLAN CRISTO REY - MANZANA 169

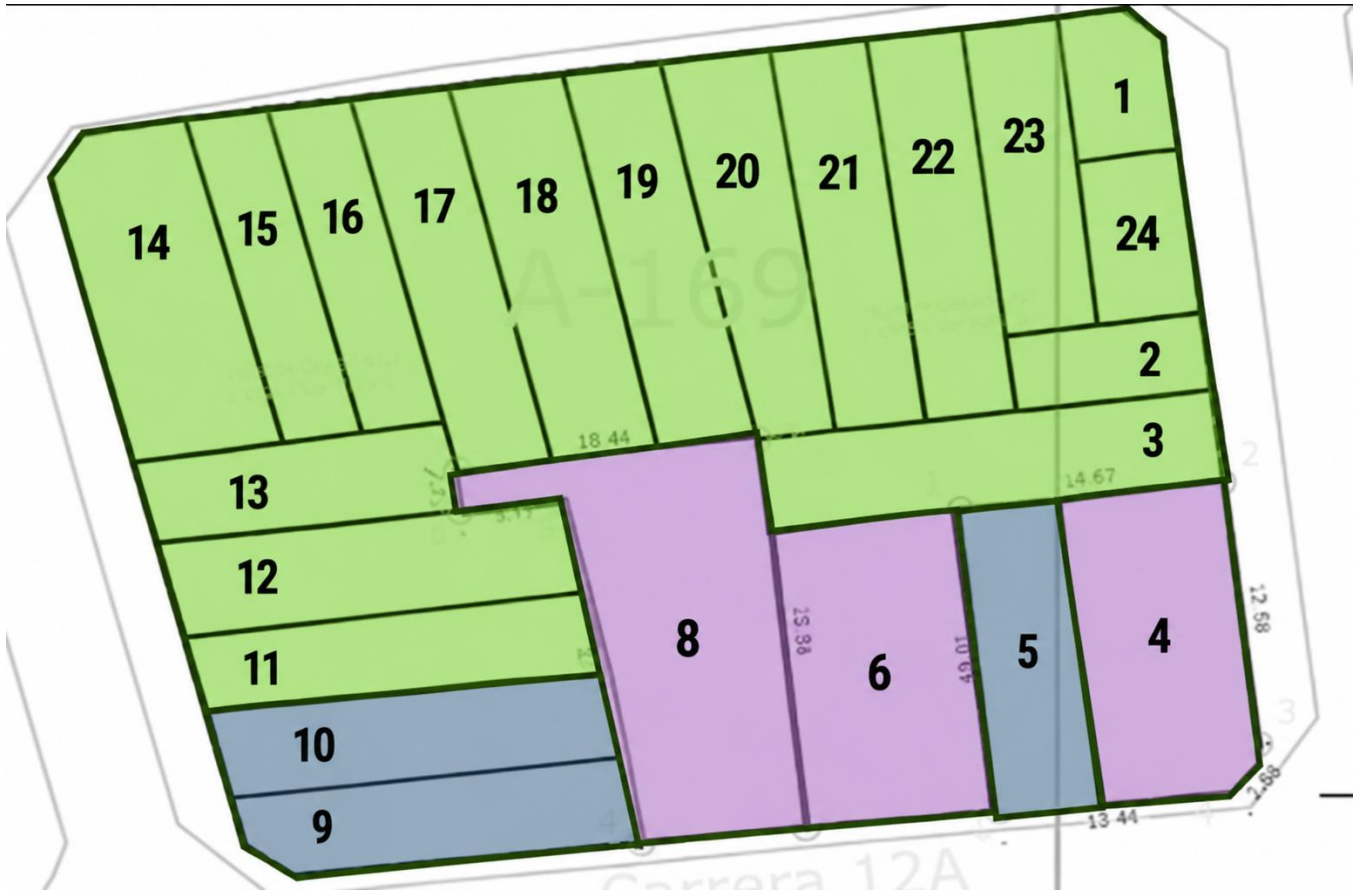

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	FECHA	PREDIOS	NECESIDADES
	Demolidos	1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	• Cerramiento – Fideicomiso (15/10/2026) ✅
	15 Y 16 DE OCTUBRE	5,9,10	• Contrato para demolición y cerramiento - Fideicomiso • Pago de Reconocimientos Económicos – Fideicomiso (09/10/2026) ✅ • Gestión Social para entrega de predios – EDRU (14/10/2026) ✅

PLAN CRISTO REY - MANZANA 169

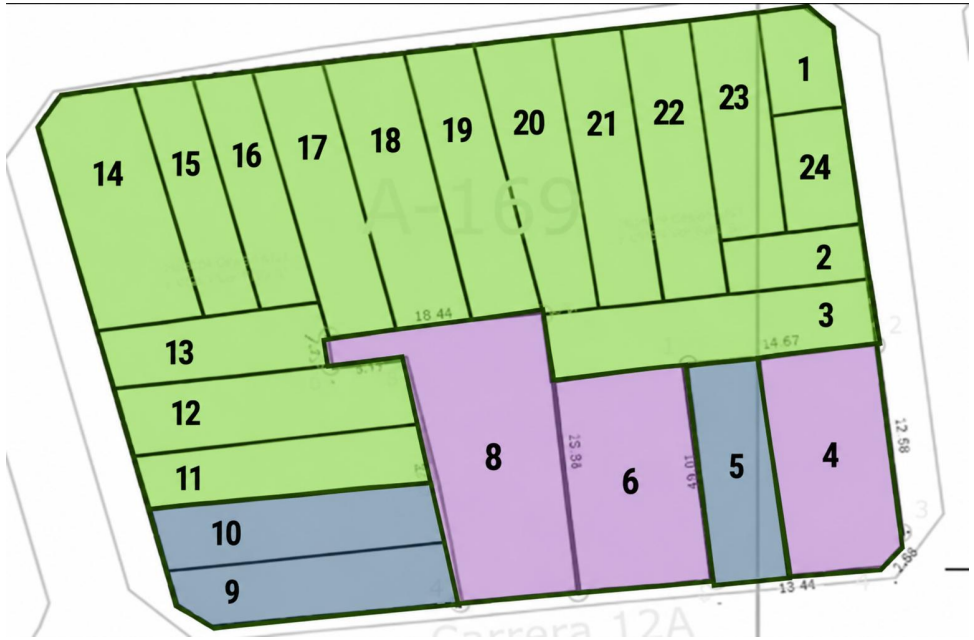


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	FECHA	PREDIOS	NECESIDADES
	2027 05 – 09 04/2027	**Expropiación** 4, 6, 8	• Verificación para determinar si procede extinción de dominio de estos predios – SSJ (05-16/10/2026) (En Proceso) • Proceso de Registro Etapa I (MZ 167) en Oficina de Instrumentos Públicos – EDRU (30/10/2026) • Traslado de recursos de al Fideicomiso (30% Etapa 1 MZ 167) – SVSH y Hacienda (30/10/2026 – 15/11/2026) • Inicio Proceso de Compra Enajenación Voluntaria – Expropiación- EDRU (Noviembre 2026 – Marzo 2027) **(3 a 4 meses términos de ley)** • Apoyo ante Oficina de Instrumentos Públicos para disminución de tiempo de Transferencia de Dominio – Alcalde • Demolición – Fideicomiso (05-09/04/2027)

EDRU · PROYECTO CIUDAD PARAÍSO · PLAN PARCIAL SAN PASCUAL

Manzana 175

Valor comercial estimado de 27 predios:
$13.225 millones

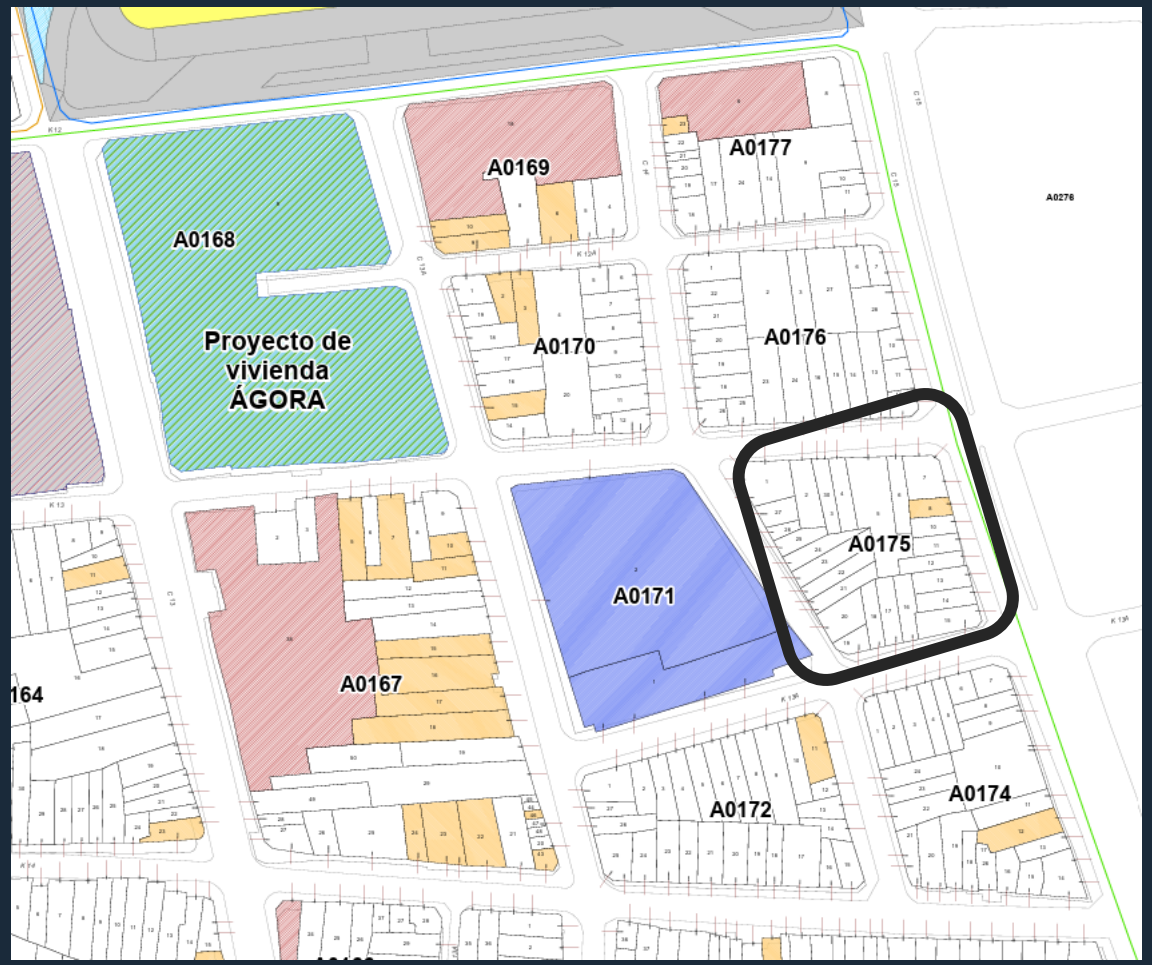

Valor total de la manzana


$13.225 millones

Valor comercial estimado · $13.224.894.068 exactos

27	3.568 m²	5.060 m²	$9.257 M
predios	de terreno	construidos	avalúo catastral base

Fuente: base catastral de la Manzana A-0175 (UAU 7, Plan Parcial San Pascual). Valor comercial = avalúo catastral ÷ 0,70.

Composición por uso del predio

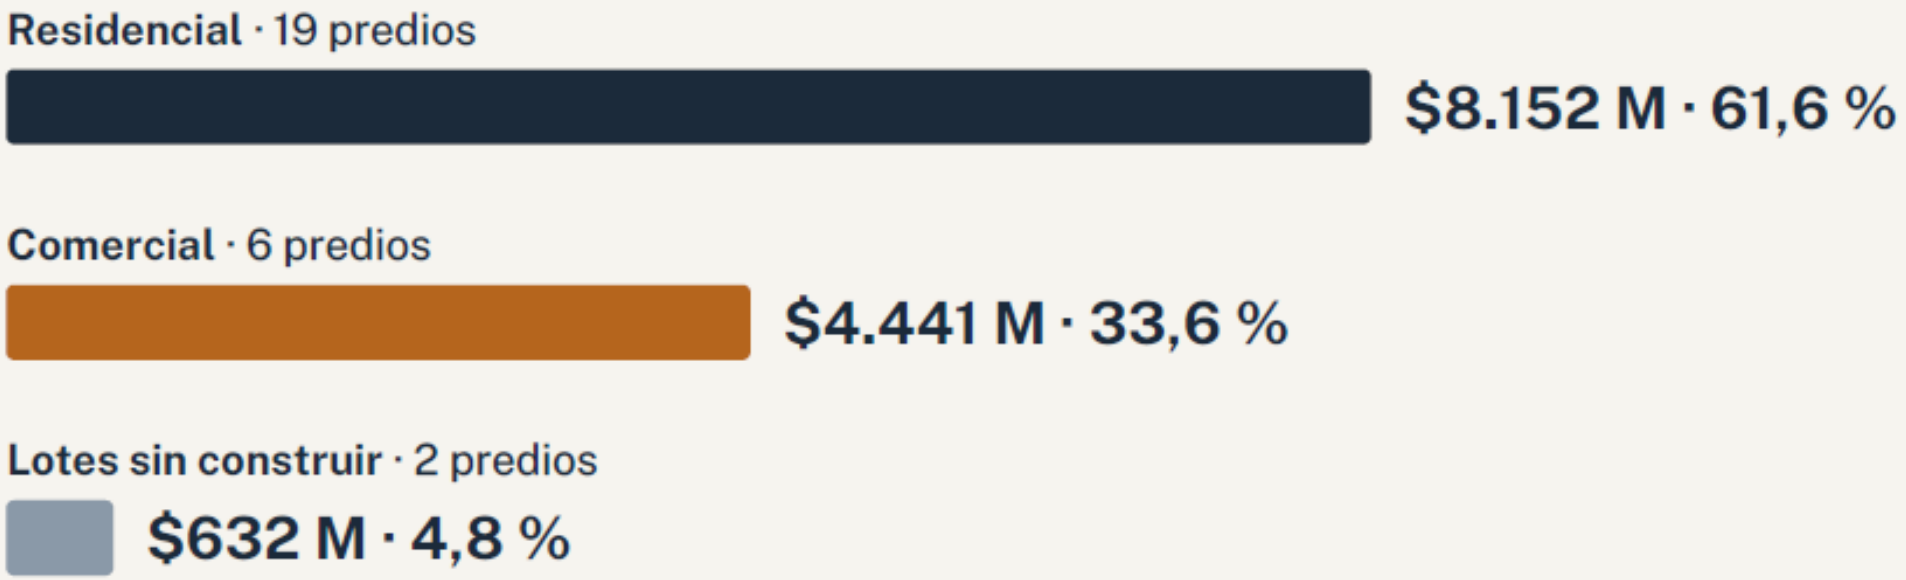

Cifras en millones de pesos, valor comercial estimado. Total: $13.225 M.

Cuatro predios concentran el 38 % del valor

$5.088 M

en 4 predios. Los otros 23 suman $8.137 M.

Dirección	Uso	Valor
CL 14 # 13-15	Residencial	$1.527 M
KR 13 # 14-56	Comercial	$1.390 M
CL 15 # 13-02	Comercial	$1.143 M
CL 14 # 13-17	Residencial	$1.028 M

Prioridad de negociación: cerrar estos cuatro predios despeja más de un tercio del presupuesto predial.

Anexo · Valor comercial por predio

#	Dirección	Uso	Valor $M
1	CL 14 # 13-15	Res.	1.527,2
2	KR 13 # 14-56	Com.	1.389,7
3	CL 15 # 13-02	Com.	1.142,8
4	CL 14 # 13-17	Res.	1.028,1
5	CL 15 # 13-44	Com.	555,9
6	KR 13A # 14-19	Res.	553,5
7	CL 15 # 13-38	Com.	546,2
8	CL 14 # 13-43	Res.	457,4
9	KR 13A # 14-23	Res.	442,1
10	CL 15 # 13-28	Com.	420,1
11	CL 15 # 13-26	Res.	417,5
12	KR 13 # 14-26	Res.	396,8
13	CL 15 # 13-14	Com.	386,5
14	KR 13 # 14-30 Ap 101	Res.	367,1
15	CL 14 # 13-63	Res.	356,6
16	CL 14 # 13-35	Res.	355,9
17	CL 15 # 13-50	Lote	348,7
18	CL 14 # 13-53	Res.	337,7
19	KR 13A # 14-09	Res.	322,7
20	KR 13 # 14-36	Res.	313,7
21	CL 15 # 13-46	Lote	282,9
22	KR 13 # 14-58	Res.	269,9
23	KR 13 # 14-28 Ap 201	Res.	253,6
24	CL 14 # 13-41	Res.	247,5
25	CL 14 # 13-51	Res.	237,7
26	KR 13A # 14-01	Res.	194,8
27	CL 14 # 13-33	Res.	72,0
	TOTAL MANZANA		**13.224,9**

Millones de pesos. Valor comercial estimado = avalúo catastral ÷ 0,70. Res. = residencial · Com. = comercial.

Para tener en cuenta

Es una cifra de referencia

La oferta de compra exige avalúo comercial por predio (Decreto 1420 de 1998 y Res. IGAC 620 de 2008).

No incluye indemnizaciones

Daño emergente y lucro cesante se suman aparte (Res. IGAC 898 de 2014), sobre todo en los 6 predios comerciales.

13 predios con catastro 2025

Suman $7.171 M y tienen avalúo catastral de vigencia 2025; la cifra puede variar al actualizarse a 2026.

Plazo del plan parcial

La manzana es la UAU 7 de San Pascual, cuya vigencia vence el 20 de marzo de 2028.

Se excluyó de la base un registro ajeno a la manzana (CL 84 # 1A1-238, comuna 6).

Parque del viento o parque de la cometa

Hagamos que el centro de Cali vuelva a volar.



EDRU
Empresa de Desarrollo
y Renovación Urbana












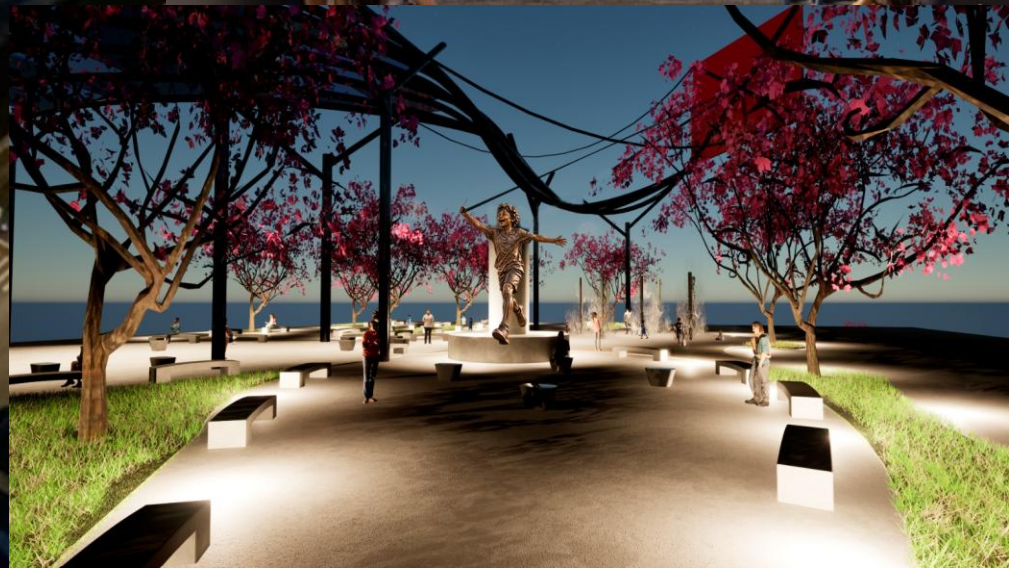

PLAN CRISTO REY

PUBLICIDAD CERRAMIENTOS

PRODESA / AGORA: Inicio miércoles 7 de octubre – hasta miércoles 14 de octubre

TERMINAL : Inicio martes 13 de octubre – hasta miércoles 14 de octubre



